
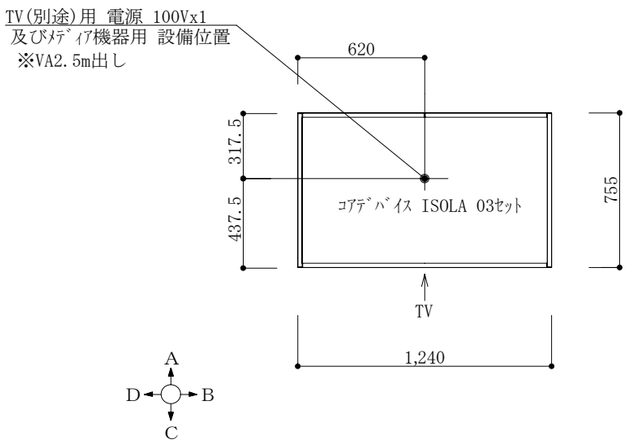


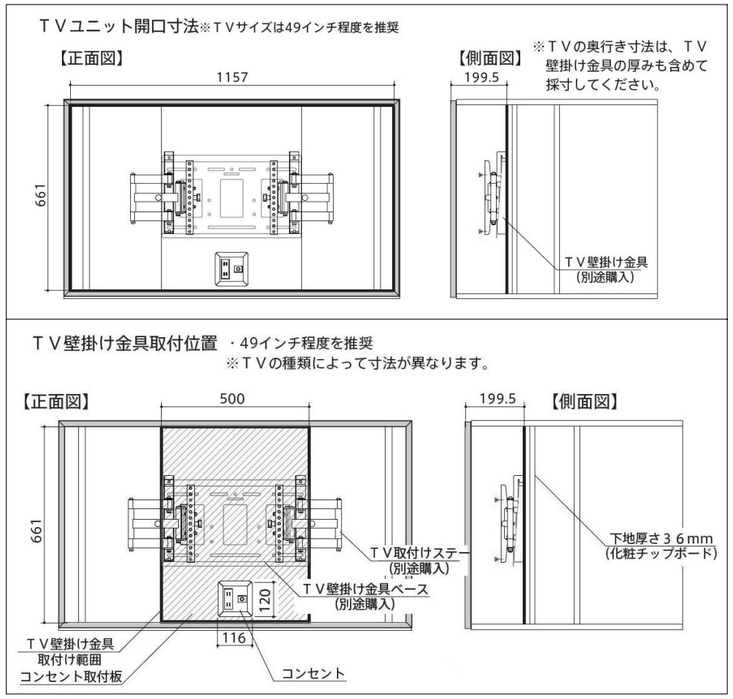


［設備配管資料］

ＴＶ別途	○	100V		

［取付・設置説明書］

ISOLA収納

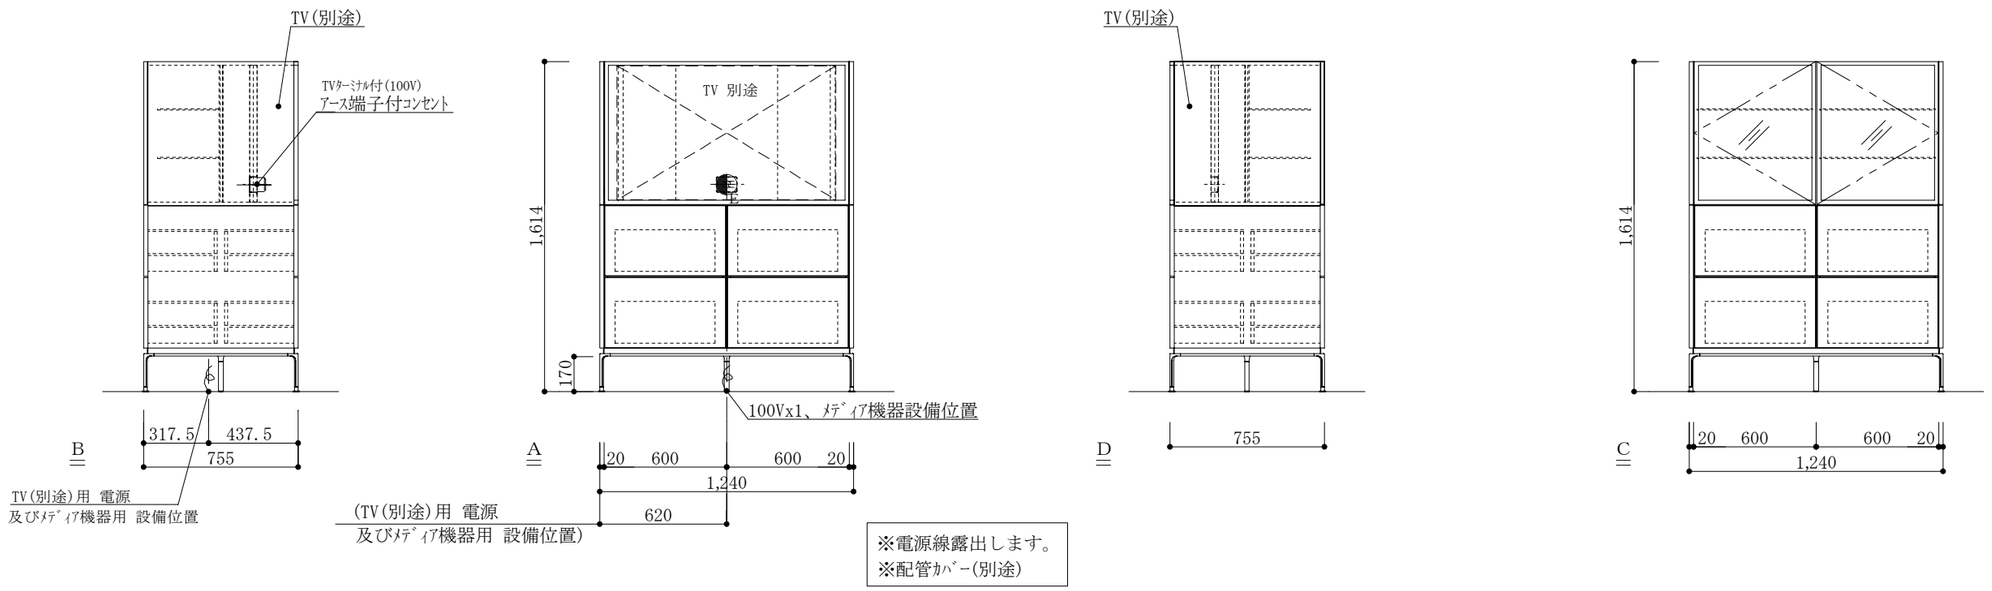


※図面の意匠は実物と異なる場合がございます。
※別途工事及び別途部品につきましては別途工事明細書をご確認ください。

図面番号 3100120034-44　見積番号 3100120034-17　受領印	図名 ｺｱﾃﾞﾊﾞｲｽ ISOLAﾌﾟﾗﾝ	担当 米子ｼｮｰﾙｰﾑ	日付 2026/10/19
ｺｱﾃﾞﾊﾞｲｽ ISOLA ﾌﾞﾗｯｸﾏｰﾌﾞﾙ(RLA1) ﾌﾟｯｼｭｵﾝｽﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑ　管理番号:14438	工事名 米子ｼｮｰﾙｰﾑ展示品 展示品ﾘｽﾄ②	製図 宮井	縮尺 1/30

TOYO KITCHEN STYLE®

No. 1

［工事区分］

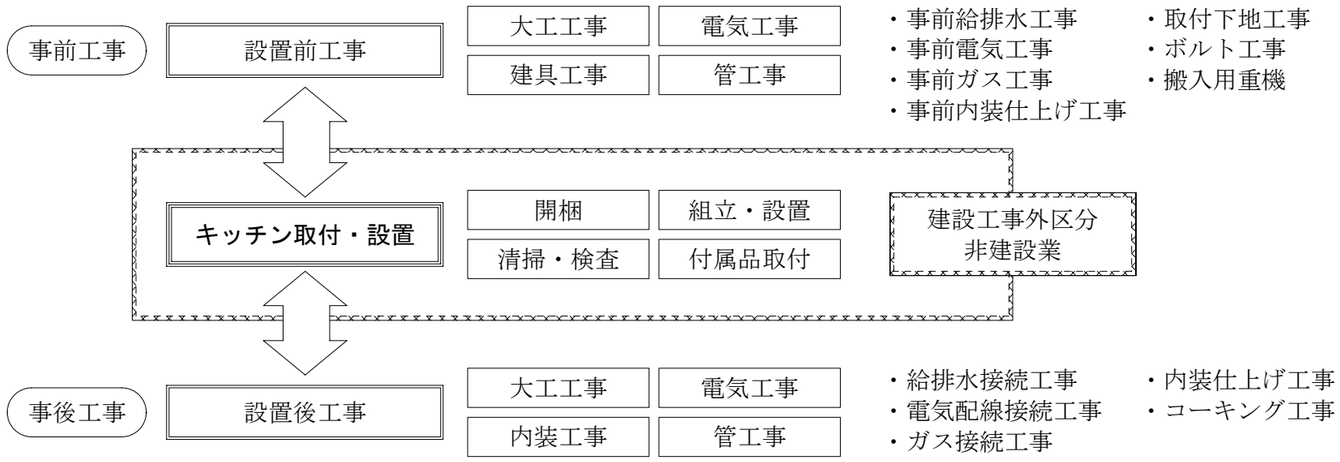

［別途部材・別途工事区分・無償にて支給･貸与願う資材設備等・産業廃棄物の処理］

別途部材

(1) ユニット・壁面パネル・レンジフード取付用胴縁及び受け桟木
(2) ユニット固定の壁ボルト・ナット・ワッシャー
(3) レンジフード用φ150配管ダクト
(4) レンジフード用φ150ベントキャップ又はウェザーカバー（外壁）
(5) レンジフード取付用アンカーボルト・ナット・ワッシャー
(6) レンジフード用コンセント
(7) 調理機器、食洗機用アース端子付きコンセント
(8) ビルトイン機器用配線カバー
(9) 調理機器の配管継手・配管材
(10) 給水・給湯及び排水・浄水器等の止水栓・配管継手・配管材
(11) タイル用接着剤・目地材
(12) その他器具用コンセント

別途工事

(1) ２階以上の搬入
(2) ユニット・壁面パネル・レンジフード取付用胴縁及び受け桟木等の下地工事
(3) ユニット固定の壁ボルト取付工事
(4) レンジフード配管用ダクトの貫通穴開け工事
(5) レンジフード配管ダクト設置工事,並びにベントキャップ又はウェザーカバーの取付工事
(6) レンジフード用アンカーボルト取付工事
(7) レンジフード用コンセントまでの配線並びに結線工事
(8) 調理器、食洗機用アース端子付きコンセントまでの配線並びに結線工事
(9) 調理器接続口（１／２Ｂ）までのガス管の配管（ガスコック含む）取付工事
(10) 給水・給湯及び排水・浄水器等の配管工事と接続工事
(11) 給水・給湯に伴う止水栓取付工事
(12) タイル工事
(13) ウォールキャビネット下の照明器具までの配線並びに結線工事
(14) 建築との取り合い部分のコーキング工事
(15) ユニット本体に付随しない照明器具の取付工事

無償にて支給・貸与願う資材設備等

(1) ２Ｆ以上の場合は、部材搬入用レッカー、リフト等の運搬設備及び運転者
(2) 現場作業用動力、光熱、水等の提供
(3) 工事に必要とされる部材の保管場所等の提供

産業廃棄物の処理

取付工事で発生した産業廃棄物は元請様の処理責任になります。

［ご署名欄］※ご発注の際は図面内容をご確認の上、ご署名ご捺印をお願いします。

［お施主様］　年　月　日

氏名　印

［建築業者様］　年　月　日

会社名

ご担当者様名　印

［販売店様］　年　月　日

会社名印欄

ご担当者様名　印

［特約店様］　年　月　日

会社名印欄

ご担当者様名　印

※ご確認お願いいたします。

［天井高］　CH=

※レンジフード高さは現場調節が出来ません。

［ガス種］　都市ガス　or　プロパンガス

［現場住所］

図面番号 3100120034-44　見積番号 3100120034-17 管理番号:14438	図名 ｺｱﾃﾞﾊﾞｲｽ ISOLA工事区分	担当 米子ｼｮｰﾙｰﾑ	日付 2026/10/19
	工事名 米子ｼｮｰﾙｰﾑ展示品 展示品ﾘｽﾄ②	製図 宮井	縮尺

TOYO KITCHEN STYLE®

No. 2
